東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年1月29日


通番	R0701	学校名	玉緒小学校	地区名	町名	大森町
No.	1			八日市地区		
路線名		大森8号線裏山線				
危険内容		・歩行者自転車優先道路をまたぐ信号機のない交差点で、角には浄水槽や小屋アパートなど死角になるものがあり、カーブミラーが設置してあっても横断者・運転者共に認識しづらい。直線道路で車のスピードも出やすく、危険な交差点なので、対策をお願いしたい。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	交通量など見て、横断歩道の前後に黄色の路面標示を入れるか検討	検討中
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

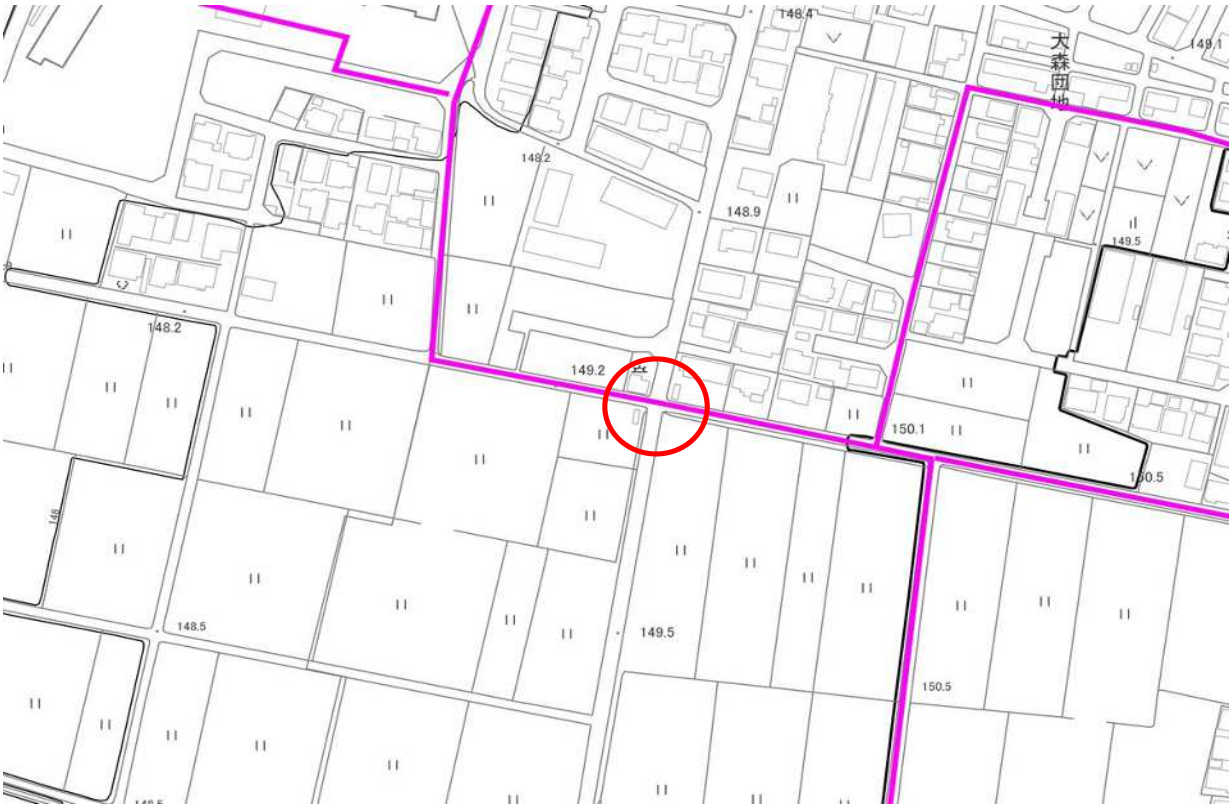
148.4
大森団地
149.1
148.2
148.9
149.5
148.2
149.2
150.1
150.5
148.5
149.5
150.5

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年1月29日


通番	R0703	学校名	玉緒小学校	地区名	町名	大森町
No.	2			八日市地区		
路線名		大森7号線				
危険内容		・児童の登下校中に車やバイクが横を通り危ない。以前登校中に児童がバイクと接触し、バイクはそのまま逃げてしまうことがあった。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	路線の前後に路面標示（徐行など）を検討	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
	

備考	

通学路点検箇所 位置図

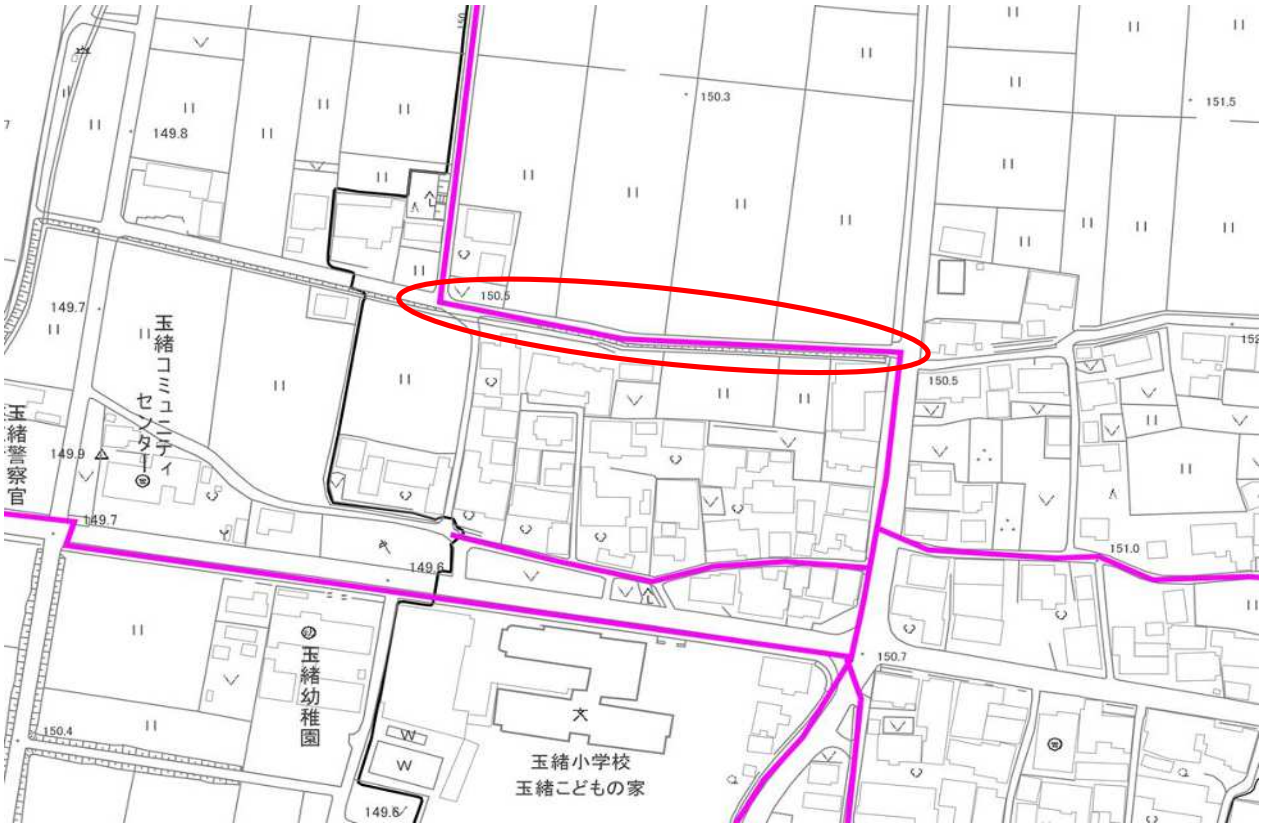
玉緒コミュニティセンター
玉緒警察官
玉緒幼稚園
玉緒小学校
玉緒こどもの家
149.8
150.3
151.5
149.7
150.5
149.9
149.7
149.6
151.0
150.7
150.4
149.6

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年1月29日

通番	R0704	学校名	玉緒小学校	地区名	町名	尻無町
No.	3			八日市地区		


路線名	尻無大森団地線裏山線
危険内容	・高架下を抜け出た児童と車が接触する危険がある。抜け道として使っているのか、車もスピードを出しながら通る。児童にも声かけはしているが一旦停止をしないで飛び出してしまう。飛び出し坊や等の設置はしてあるが、危険を感じるため、更なる対策をしていただきたい。

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	足形マークを学校に案内	検討中

対策前	対策後
 	

備考	過去5年事故記録ないため、一旦停止はできない。

通学路点検箇所 位置図

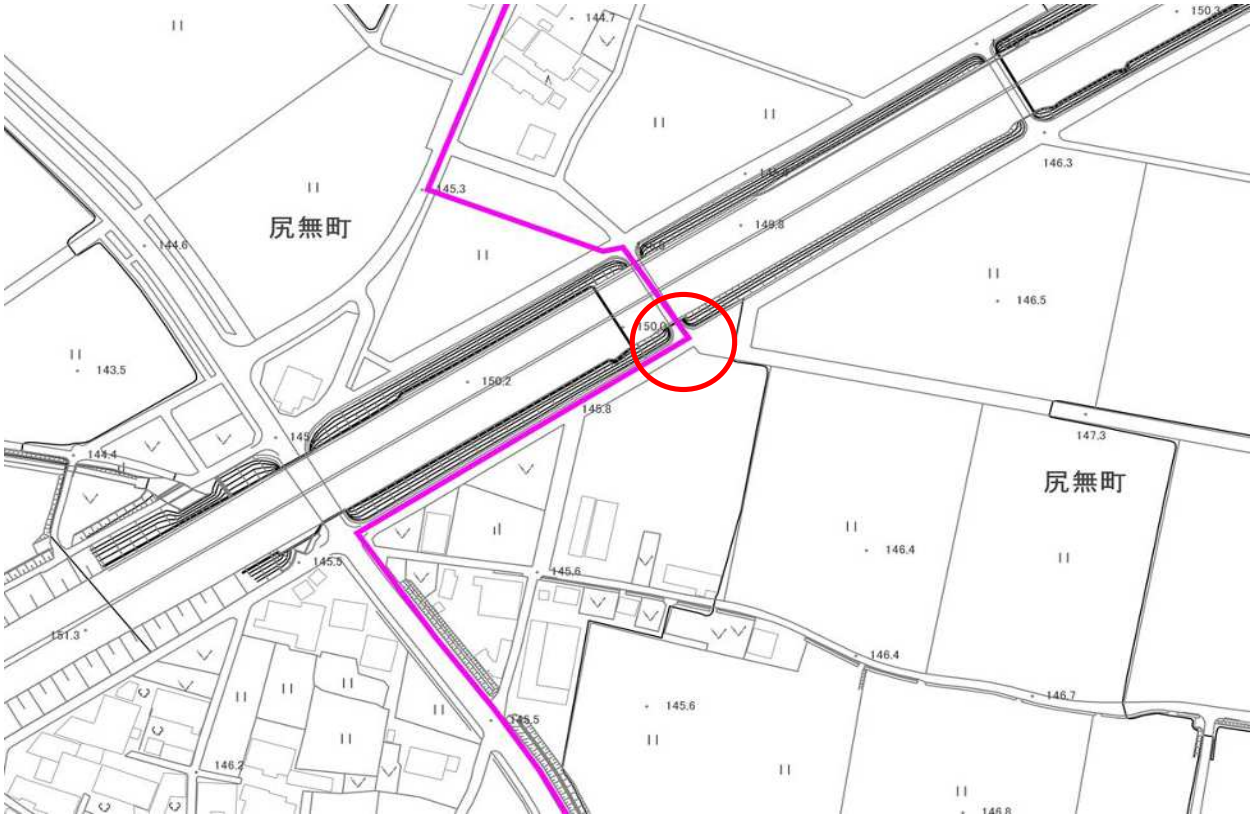
尻無町
尻無町
144.7
145.3
144.6
143.5
150.2
148.8
147.3
146.4
145.6
146.4
146.7
145.6
145.5
146.2
151.3
146.3
149.8
146.5
147.3

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年1月29日


通番	R0737	学校名	愛東北小学校	地区名	町名	百済寺町
No.	4			愛東地区		
路線名		百済寺丁・下中野線百済寺町公民館～フレンドオート				
危険内容		紅葉シーズンは湖東三山を回られる大型バスが多くなり、唯一大型バスが百済寺へと通れる道と通学路が同じになっています。バスの運転手は、樹木（枝）を避けるためか、下校中の子どもたちの列をギリギリ通り、接触しそうな場面がありました。特に、下校時に重なり、大型バスの往来が多くなるので、改善をお願いします。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	通行制限は影響大きいためできない	該当なし
東近江市道路課	枝を落とす（通行に支障のある範囲のみ）	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
	

備考	

通学路点検箇所 位置図

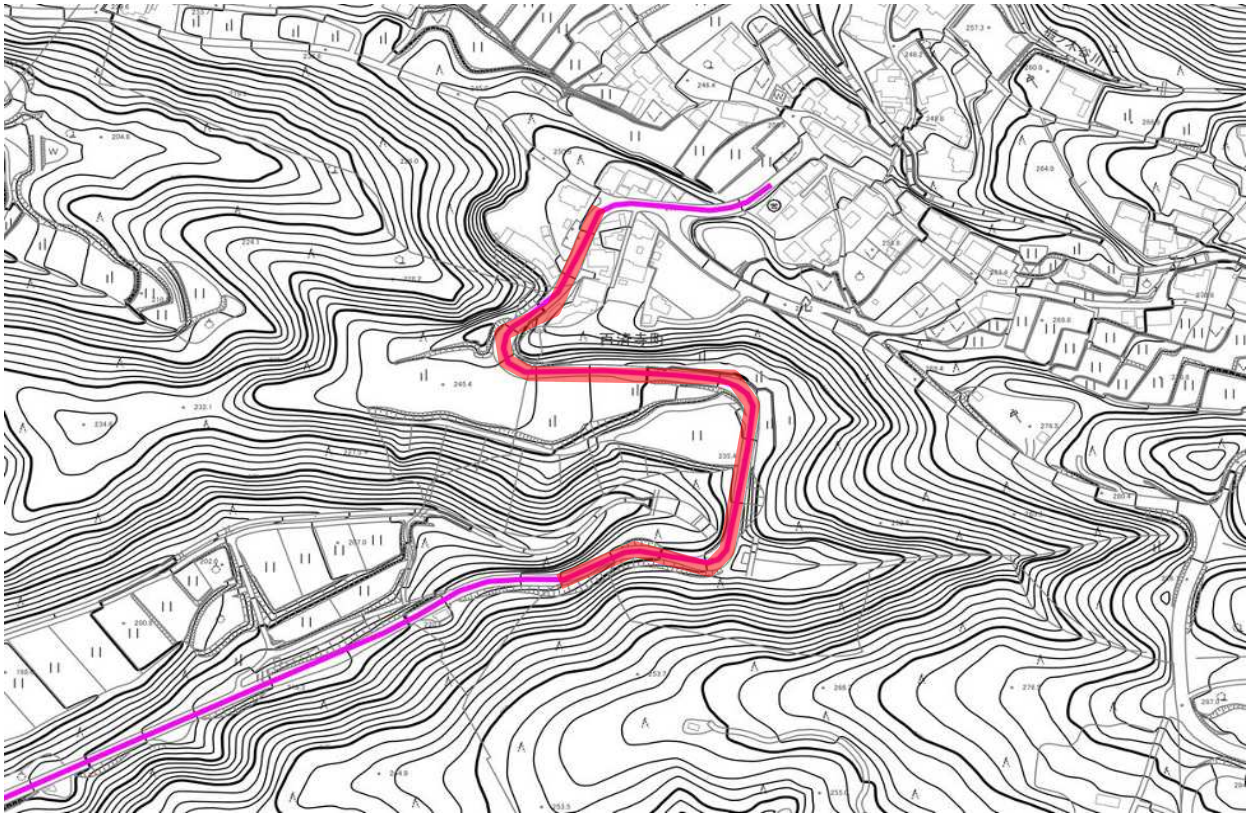

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年1月29日

通番	R0744	学校名	湖東第一小学校	地区名	町名	下里町
No.	5			湖東地区		

路線名	市道（下里町内の集落道路。ちょこっとタクシー「下里停留所」より、浄華寺前を経て平松交差点に至る道）
危険内容	平松町・下里町の通学路は、朝の通勤時間帯、歩道等がない狭い道路にも関わらず通行量が多く、子どもたちが歩いているすぐそばを高速ですり抜ける車両もあるため、保護者から危険性を訴える声が寄せられています。平松町の子どもたちが下里町の集落に入る交差点の見通しの悪さや、下里町集落内の幅員の狭さなどの課題があります。歩道設置が理想ではありますが、現実的な案として、グリーンベルトや「通学路」標識の設置により視覚的に通学路であることを示していただくことと、交差点での一旦停止標識の設置などをお願いします。

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	東側横断歩道の移設を検討	検討中
東近江市道路課	外側線の引き直し、グリーンベルトの設置 西側T字路に路面標示	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	西側T字路は交通量や溜まりの確保の点で設置できない。

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月2日


通番	市政要望等	学校名	玉緒小学校	地区名	町名	大森町
No.	6			八日市地区		
路線名		県道高木八日市線（170号） 主要地方道八日市蒲生線（46号）				
危険内容		【玉緒小追加】 大森町交差点にスクールゾーンの表示を希望。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	交差点内にライン（破線）を追加	R8年度以降施工
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	交差点東側の停止線を前に出すことも検討されたが、大型車両が転回できないため動かせない。

通学路点検箇所 位置図

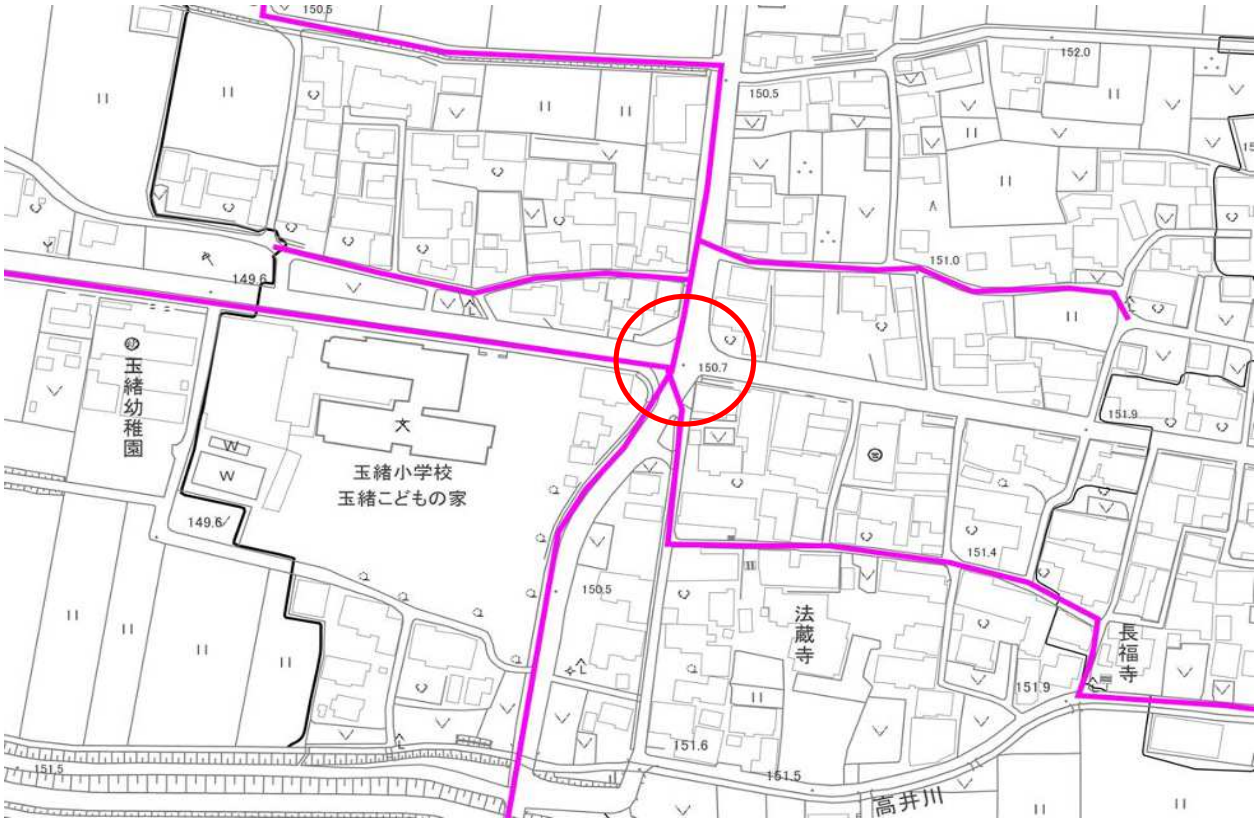
玉緒幼稚園
玉緒小学校
玉緒こどもの家
法蔵寺
長福寺
高井川
150.5
149.6
150.7
151.0
151.9
151.4
151.6
151.5
152.0

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月2日

通番	R0725	学校名	市原小学校	地区名	町名	高木町
No.	7			永源寺地区		


路線名	県道中里山上日野線（508号）
危険内容	道幅が広く、建物も少ないためか、加速して通過する車が多い。特に朝の登校で児童が横断歩道を渡るのと、通勤する人の車が多い時間帯が重なり、危険なときがある。以前は、非常に危険な運転を意図的に繰り返す人がいて、駐在所にも相談したことがある。 左欄②については、令和7年2月初旬に高木自治会長様が設置してくださったものもあるが、それに加えて、もっと目立つ看板や標識などの設置が必要である。

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	ラインの補修（横断歩道含む） 横断歩道の前後に黄色の路面標示を入れるか検討	R8年度以降施工
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

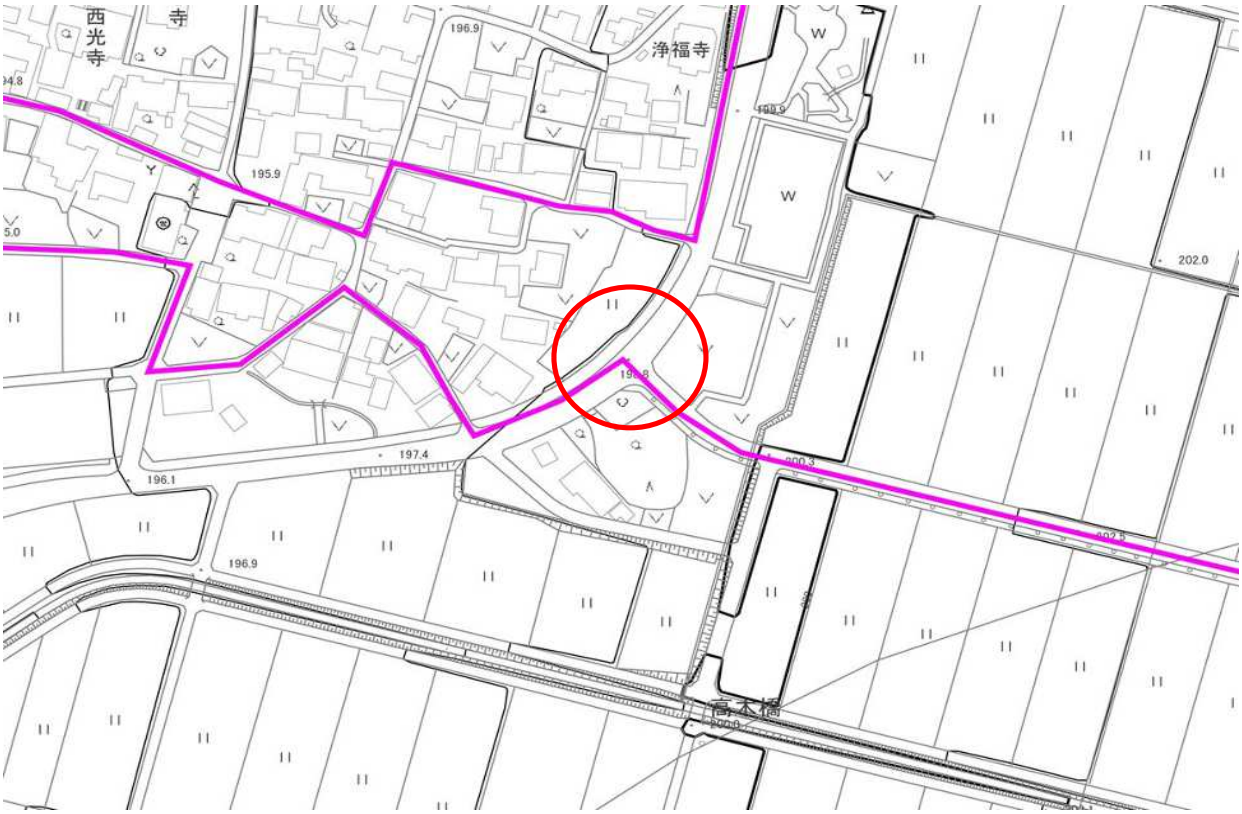

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月2日


通番	R0726	学校名	山上小学校	地区名	町名	山上町
No.	8			永源寺地区		
路線名		県道甲津畑山上線（189号）				
危険内容		山上6組付近 R421を曲がってから7組までしか歩道が設置されていない。狭い道だが、朝夕の交通量が多く、人通りが少ない場所である。特に夏場、草が生えると一段と狭く、カーブがあるため、運転者からの視界が悪くなる。看板を設置したが、安全性を高めるために、歩道の延長等をお願いしたい。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	歩道は延長できない。 路側帯が狭い一部箇所のラインを引き直し、路側帯を広げる。	R8年度以降施工
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

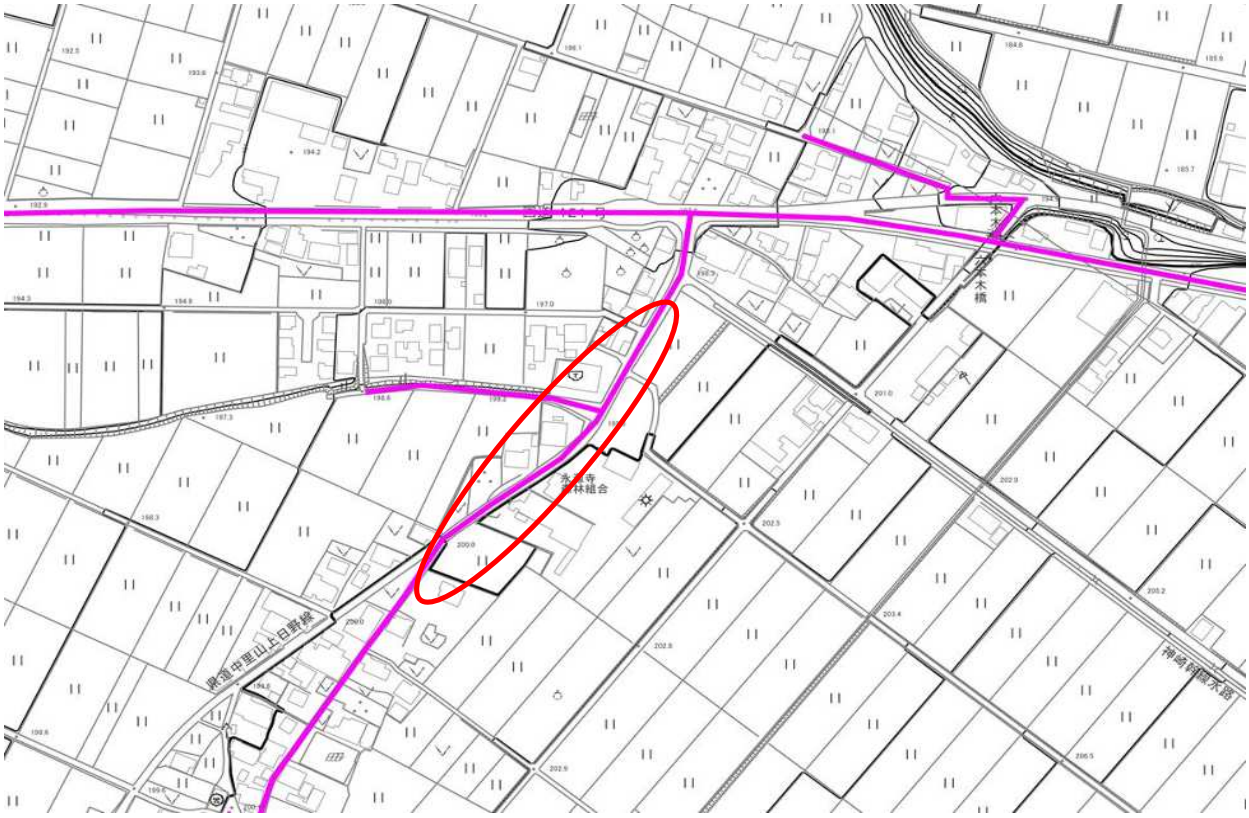

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月2日

通番	R0760	学校名	蒲生東小学校	地区名	町名	木村町
No.	9			蒲生地区		
路線名		主要地方道彦根八日市甲西線（13号）				
危険内容		交通量が多いため。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後

備考	タクシー利用により当該箇所を通行する児童なしのため取り下げ。

通学路点検箇所 位置図

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月2日


通番	R0762	学校名	蒲生東小学校	地区名	町名	桜川西町
No.	10			蒲生地区		
路線名		県道桜川西中在寺線（524号）				
危険内容		横断時に車がなかなか止まってくれない。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	学校で迂回路案を検討。	検討中

対策前	対策後
 	

備考	迂回路案：T字路を県道側に行かず北東に進み、交差点を渡って在所の中を通り桜川西公民館横に出るルート。

通学路点検箇所 位置図

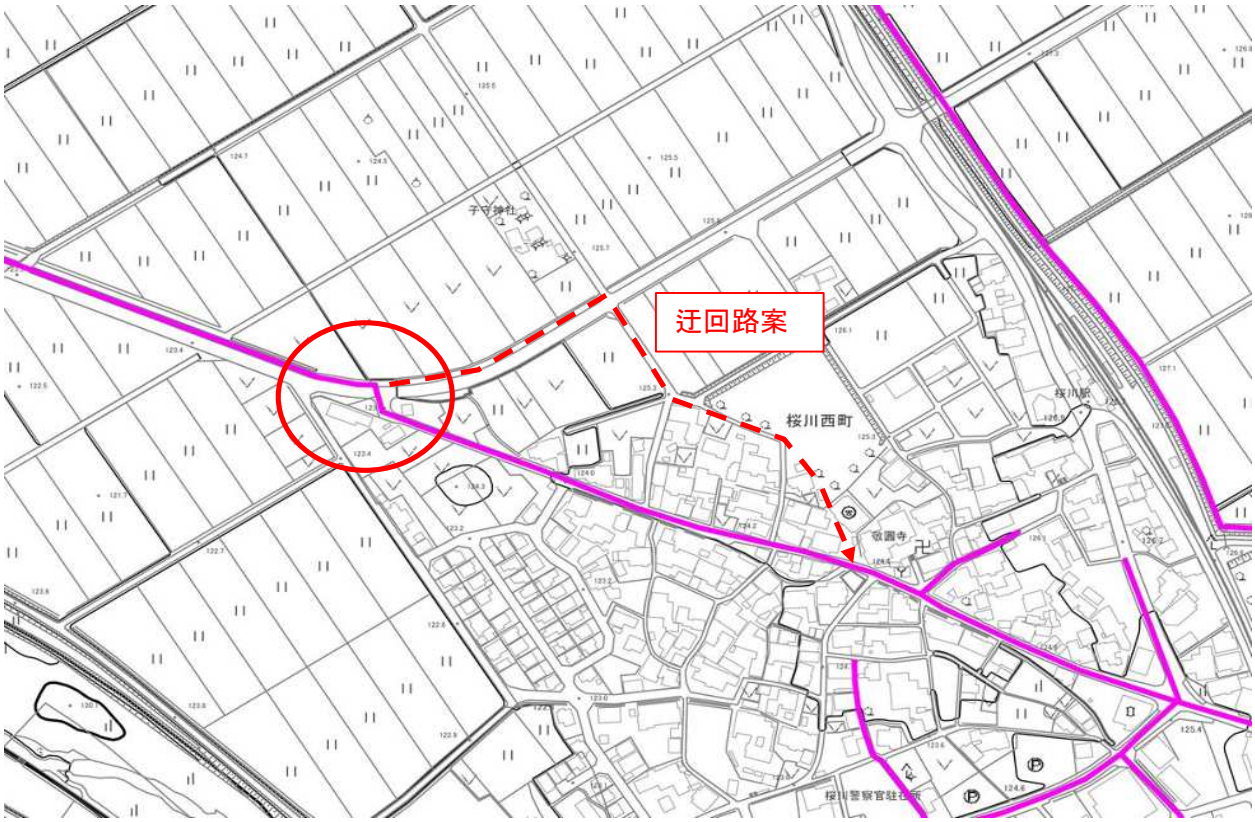

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月2日

通番	R0768	学校名	蒲生北小学校	地区名	町名	蒲生堂町
No.	11			蒲生地区		
路線名		「蒲生北小学校口」点滅信号				
危険内容		普段は点滅信号で児童横断時には押しボタンを使用しているが、車道用信号が赤になっても交差点に進入してくる車を度々見かける。児童に青になっても十分に左右の確認をしてから横断するよう指導する。交通量の多い登校時には、地域のボランティアの方が見守りをする等の対策をとっているが、さらなる安全対策の検討が必要である。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	実態調査し、信号を目立たせる方法を検討し実施	R8年度以降施工
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図


国道 477 号
蒲生北小学校
蒲生北こどもの家
117.3
118.5
116.6
117.5
117.0
116.8
117.7
117.9
116.5
118.5
117.9
117.7
117.5
119.4
118.4
118.0
119.0

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月5日


通番	R0702	学校名	玉緒小学校	地区名	町名	上大森町
No.	12			八日市地区		
路線名		林田上大森線 県道高木八日市線（170号）				
危険内容		・児童が横断するときに、道路の形状のせいか県道170号から抜け道として通る車が勢いよく侵入してくることがある。 交通事故も起こっているので、飛び出し坊やの設置だけでは不安なので、対策をしていただきたい。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	外側線を塗り直す。線の位置を内側にし、狭さくをかける。	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

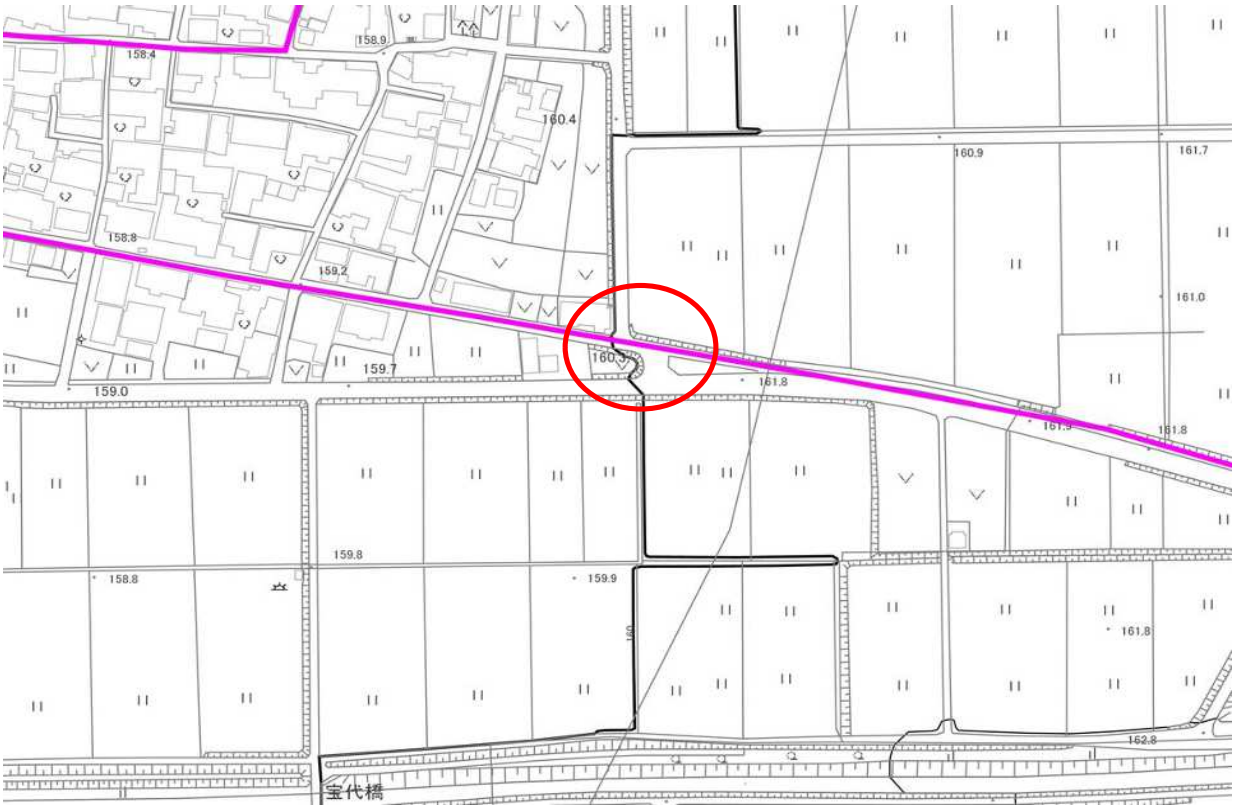
158.4
158.9
160.4
160.9
161.7
158.8
159.2
161.0
159.7
160.3
159.0
161.8
161.9
161.8
159.8
158.8
159.9
161.8
162.8
宝代橋

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月5日

通番	市政要望等	学校名	教育委員会 箕作小学校	地区名	町名	今崎町中野町
No.	13			八日市地区		


路線名	上中緑町小今線 主要地方道彦根八日市甲西線（13号）
危険内容	【東近江警察追加】 主要地方道彦根八日市甲西線の東側の歩道整備が未定となったことで、上中緑町小今線の西側の供用開始後における今崎町の一部児童の横断箇所及び対策の検討

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	上中緑町小今線の西側の供用開始後における横断箇所（彦根八日市甲西線または上中緑町小今線のどちらか）によって対策検討するため、学校を通してどちらを選択するか地域へ照会する。 →上中緑町小今線での横断を選択。	対策実施済

対策前	対策後
 	

備考	上中緑町小今線は、信号機は付かないが、横断歩道は追加される。 彦根八日市甲西線で横断する場合には、当該T字路に東西方向の横断歩道を追加する。また、西側の路肩を整備する。

通学路点検箇所 位置図

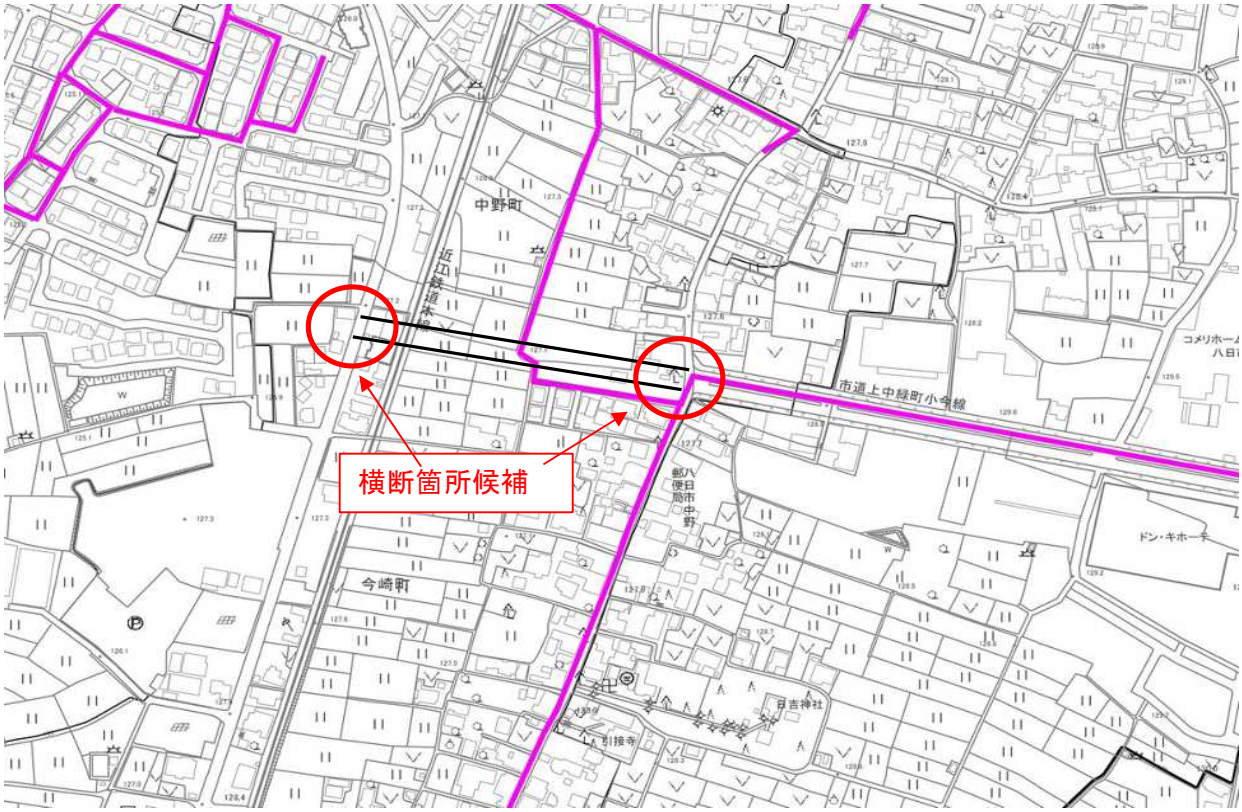

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月5日

通番	R0721	学校名	布引小学校	地区名	町名	柴原南町
No.	14			八日市地区		
路線名		県道高木八日市線（170号） 黒丸一本橋線				
危険内容		布引街道を横断して、自宅から柴原南町の集合場所へ集まる児童が現在2名います。朝夕とも交通量が多く、大型車両の通行も頻繁にあります。毎日、保護者の方の付き添いで横断している状態です。昨年度、一昨年度も要望しましたが、横断歩道の設置には至っていません。つきましては、横断歩道設置などの安全対策を要望します。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後

備考	当該箇所の利用児童がいなくなるため取り下げ。

通学路点検箇所 位置図

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月5日

通番	市政要望等	学校名	布引小学校	地区名	町名	柴原南町
No.	15			八日市地区		


路線名	芝原南芝原線
危険内容	大凧通りと布引街道の交差点は、児童の登校時刻に混み合い、毎日渋滞となるために自治会内を通り抜ける車が多い。市道である通学路が主道路であるにもかかわらず、従道路を通り抜ける車が一旦停止せずに通学路（主道路）を横切っており、たいへん危険である。そこで自治会内の通学路にあたる交差点に一時停止の標識設置など、対策を要望します。

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	破線のトマレ追加 交差点の路面標示の外枠補修	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

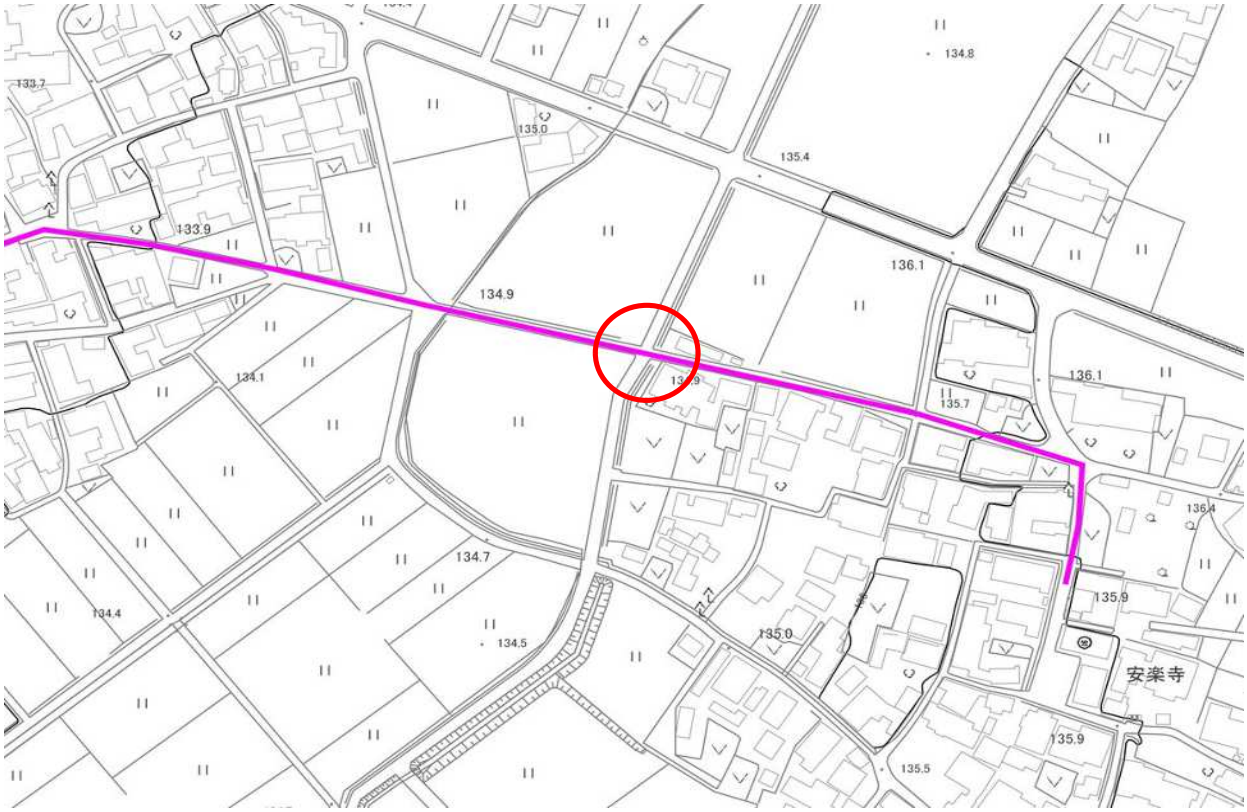
133.7
133.9
134.1
134.4
134.5
134.7
134.8
134.9
135.0
135.4
135.5
135.7
135.9
136.1
136.4
安楽寺

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月5日


通番	市政要望等	学校名	布引小学校	地区名	町名	蛇溝町
No.	16			八日市地区		
路線名		県道石原八日市線（45号） 長谷野8号線				
危険内容		朝の登校時間は、交通量が非常に多く、横断歩道を渡り難いため。令和7年度に通学路の変更も届け出をして、本横断歩道も通学路となっているので、グリーンベルトの延長についても要望します。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	（県道側）横断歩道の前後に黄色の路面標示を入れる	R8年度以降施工
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	外側線の引き直し グリーンベルトの設置	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	要望するグリーンベルトの延伸については、再度学校に確認する。

通学路点検箇所 位置図

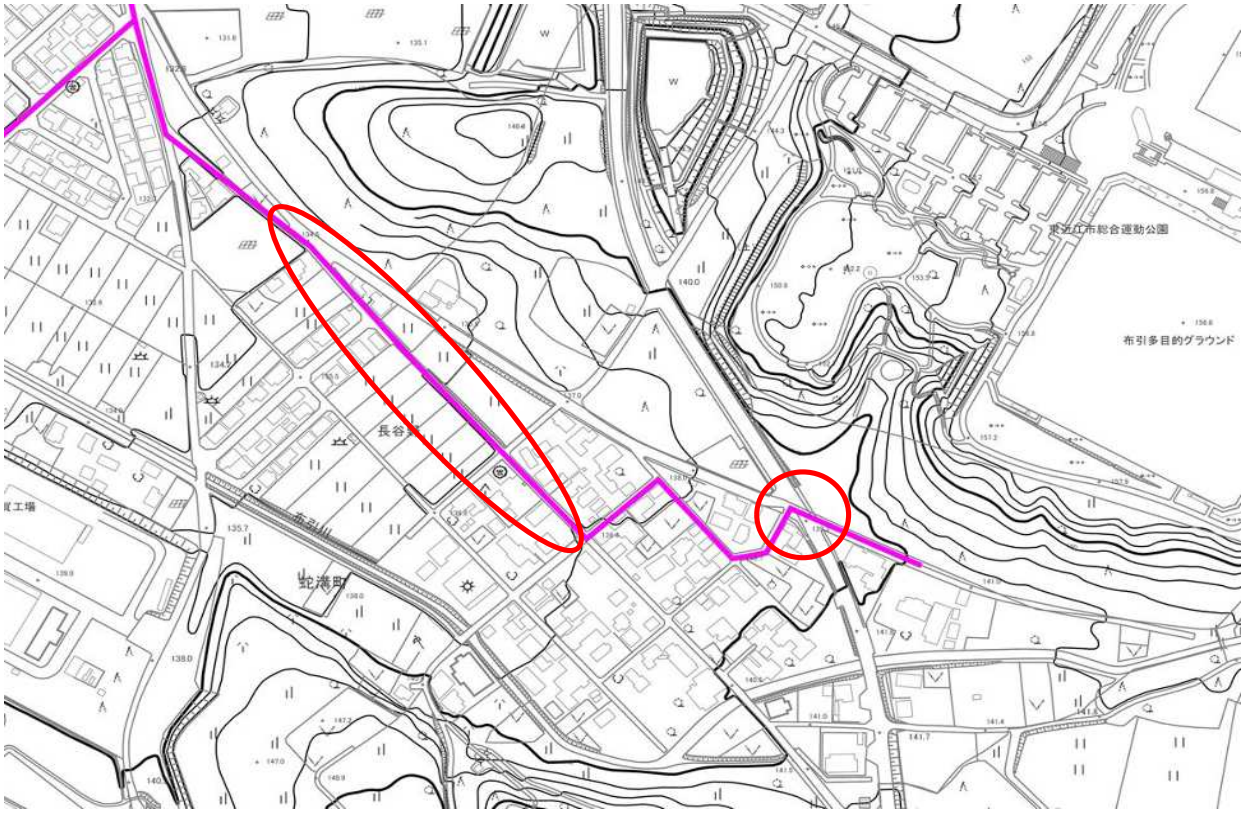

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月19日

通番	R0729	学校名	五個荘小学校	地区名	町名	五個荘竜田町
No.	17			五個荘地区		
路線名		竜田奥線				
危険内容		抜け道として、スピードを出す車が多い。道幅が狭く、車と歩行者との距離が近い。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	R8の法改正により、標識なしでも30km/h制限がかかる。 一方通行はできない。	該当なし
東近江市道路課	南側路線に外側線を入れる	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	道路幅員足りないため縁石の設置は難しい。

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月19日


通番	R0749	学校名	湖東第三小学校	地区名	町名	清水中町
No.	18			湖東地区		
路線名		清水中通学線 サイカセ線				
危険内容		県道13号から清水中へ向かうの二つ目の交差点が大変危険です。道路上に横断歩道の表示と標識を設置をお願いします。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	横断歩道は朝の状況を見て検討。	検討中
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

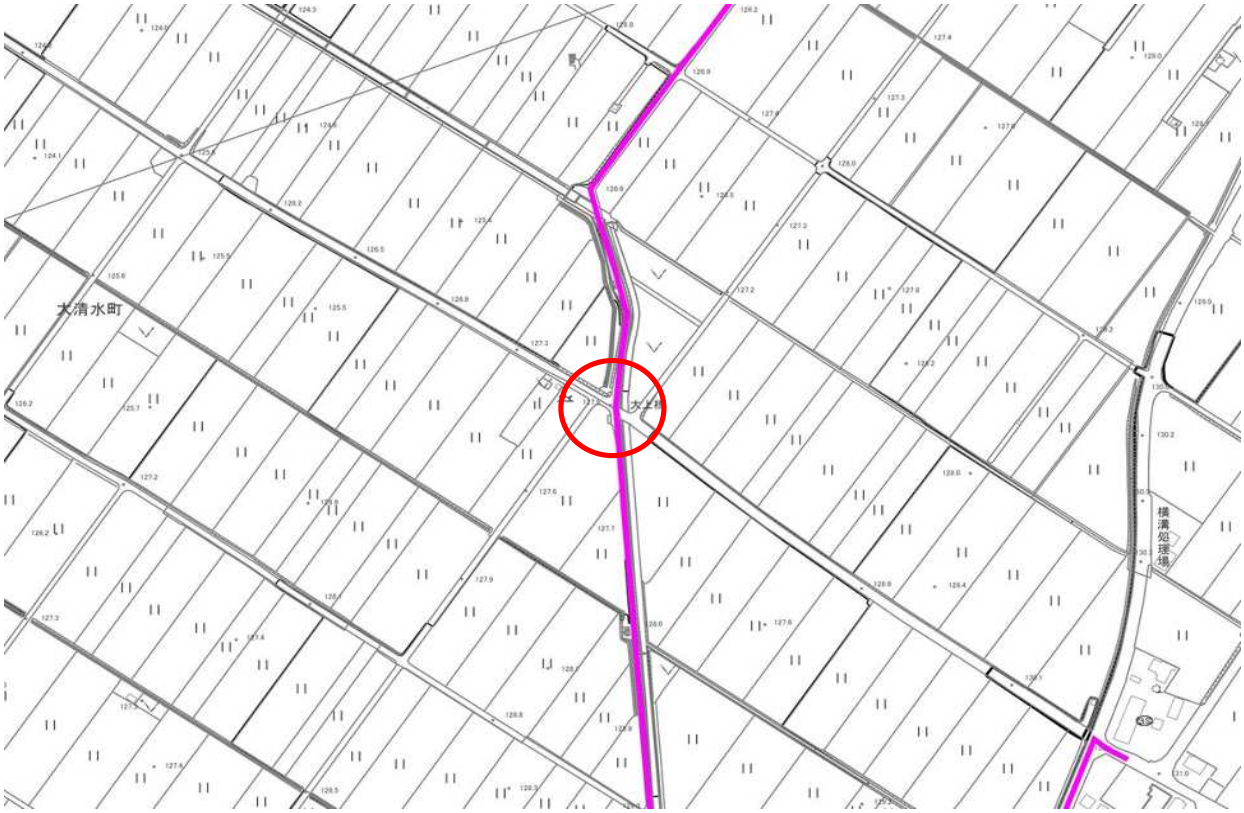

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月19日

通番	R0769	学校名	五個荘中学校	地区名	町名	五個荘竜田町
No.	19			五個荘地区		
路線名		五個荘竜田町アンダーパス				
危険内容		当該箇所は、朝の登校時、五個荘竜田町方面へ行く小学生と、五個荘三俣町方面へ行く中学生とが行き交う場所です。また、この場所は国道8号線があるため、アンダーパスになっており、自転車に乗って通学する中学生は下り坂でスピードが速くなり、徒歩小学生とぶつかってしまう危険があります。対策をお願いします。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	自転車に対する注意喚起の看板を設置	R8年度以降施工

対策前	対策後
 	

備考	広さがあればレーン分けができるが、狭すぎるため、構造的に対策はできない。

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月19日


通番	市政要望等	学校名	教育委員会 能登川東小学校	地区名	町名	山路町
No.	20			能登川地区		
路線名		林2号線付近 小川・林・能登川線				
危険内容		【山路町自治会追加】 橋に柵を設置。または、市道小川・林・能登川線のグリーンベルトにポストコーンの設置。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	橋は市道敷ではないため整備できない。 小川・林・能登川線は十分な幅員が確保されているため現状維持。	対策困難
東近江市教育委員会	（必要であれば）自治会に交通安全看板を配付	検討中

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

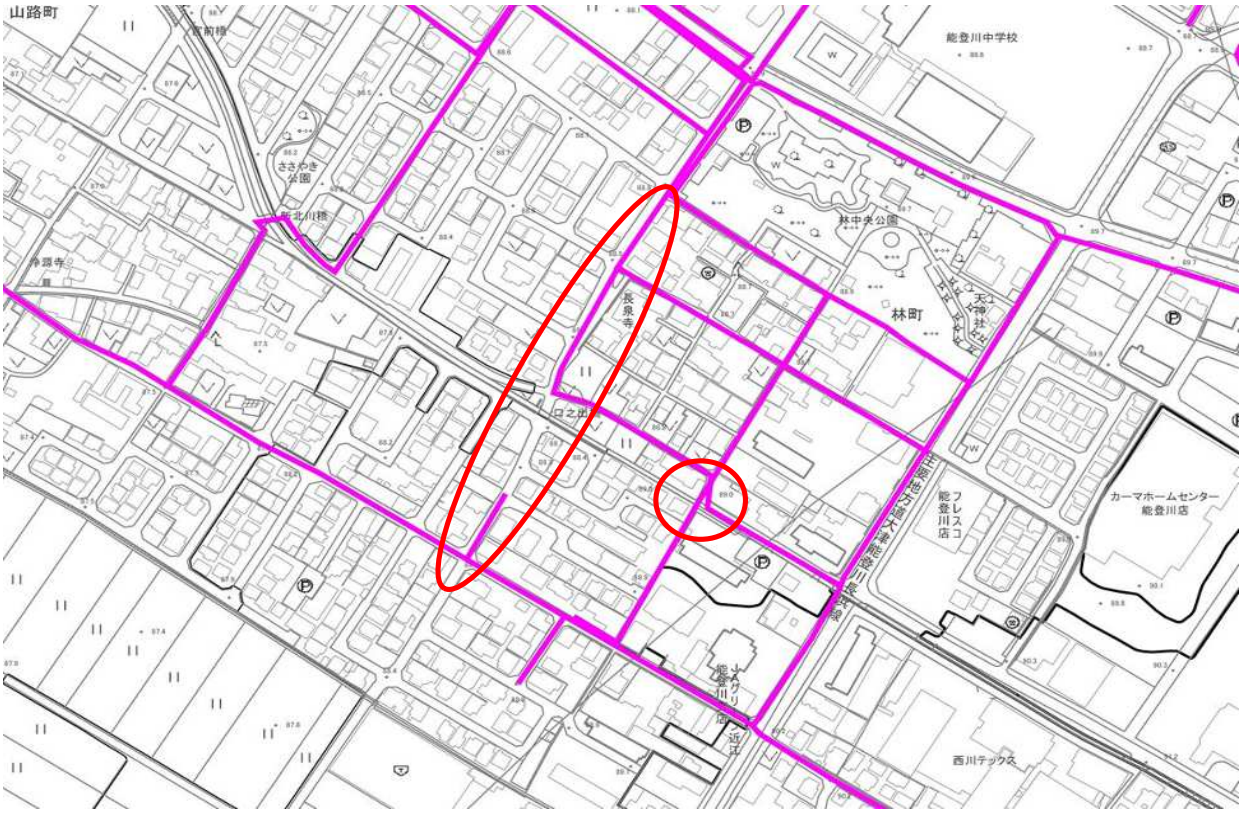

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月19日


通番	R0702幼	学校名	延命こども園	地区名	町名	小脇町
No.	21			八日市地区		
路線名		宿3号線				
危険内容		端の両端に柵等がなく、散歩時に使用する際に危険である。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	柵の設置は隣家の出入りや水門への影響見て検討。	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

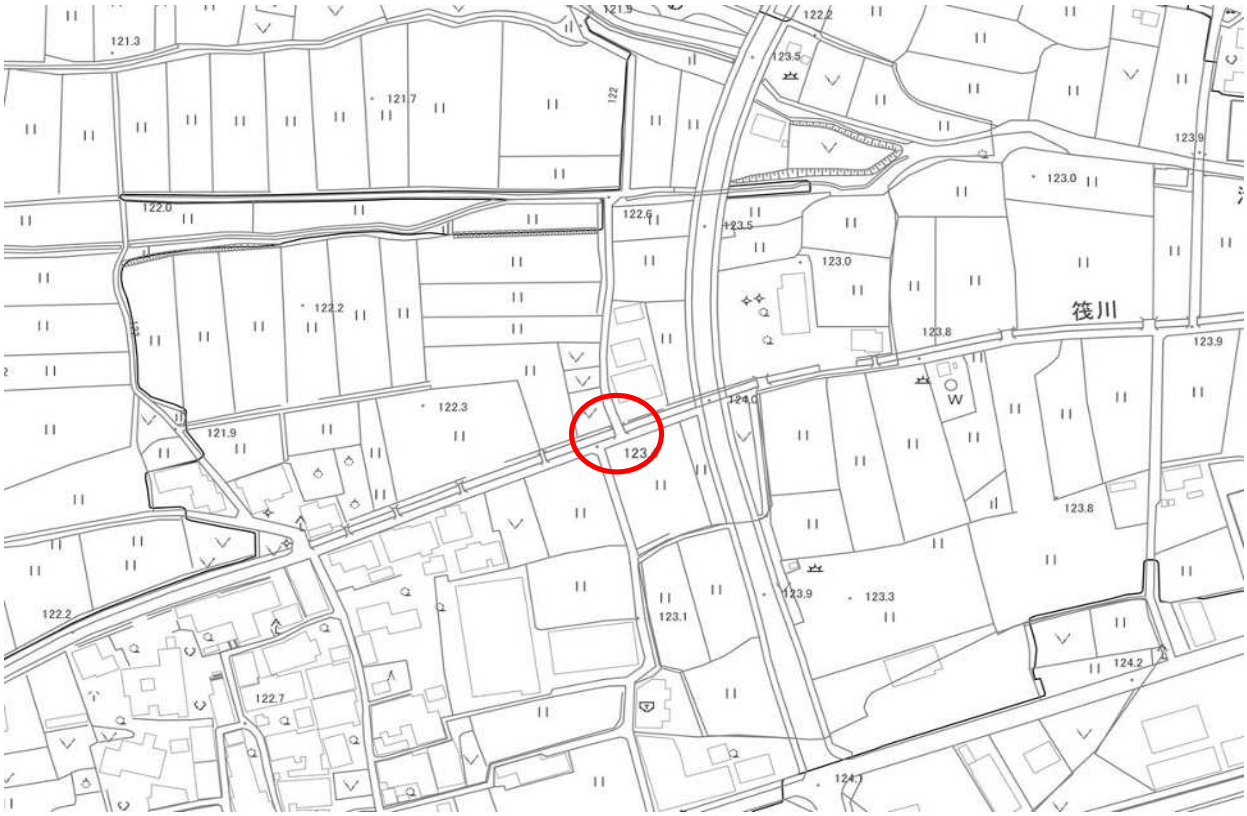

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日


通番	R0745	学校名	湖東第二小学校	地区名	町名	南菩提寺町
No.	22			湖東地区		
路線名		主要地方道彦根八日市甲西線（13号）				
危険内容		朝の通勤時間帯には自動車・大型トラックが毎分60台程度往来する。その中を児童が横断しているが横断歩道がないため、危険であり、児童の安全確保のため横断歩道の設置をお願いしたい。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	既存のラインを補修する 道を狭く見せるようにドットラインを入れる	R8年度以降施工
東近江警察署	道路形状的に横断して欲しくない場所なので、横断歩道を設置することはできない。	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	（必要であれば）自治会に交通安全看板を配付	検討中

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

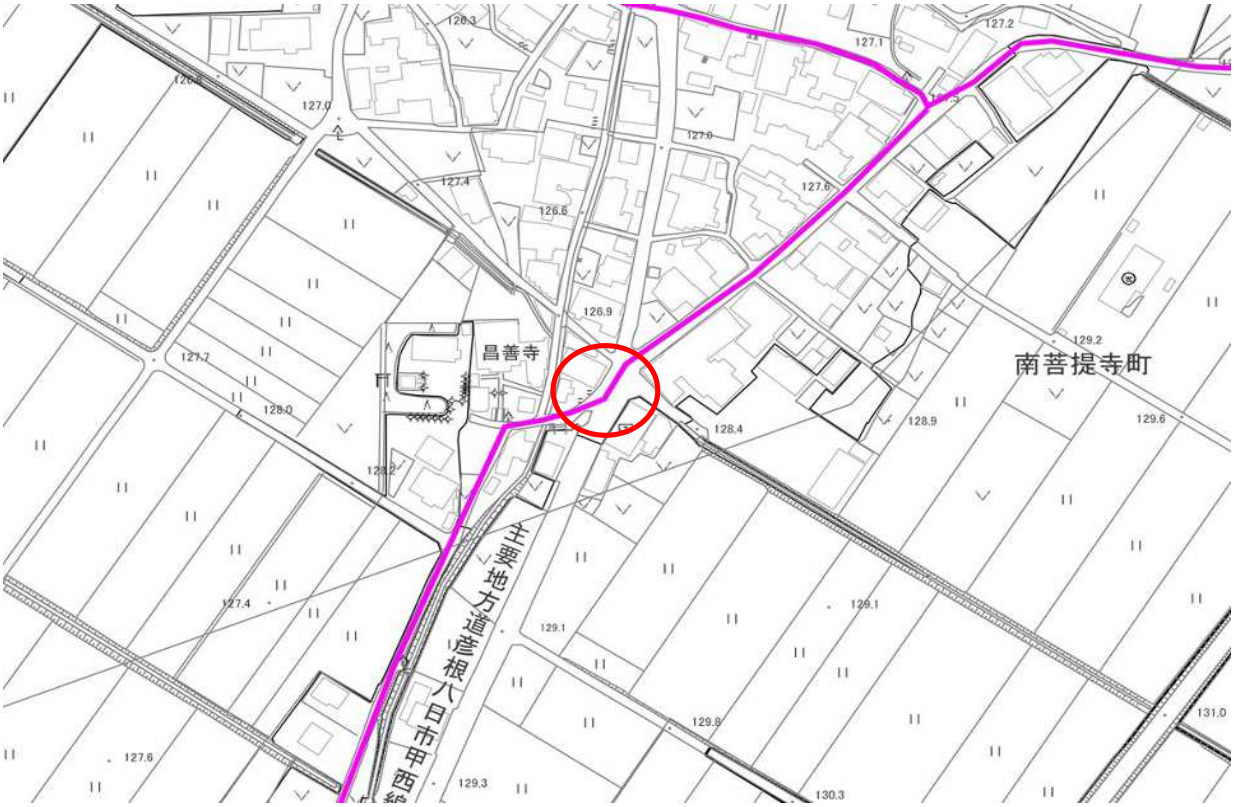

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日


通番	R0746	学校名	湖東第二小学校	地区名	町名	北菩提寺町
No.	23			湖東地区		
路線名		県道横溝秦荘線（218号）				
危険内容		道路形状が緩やかなカーブで、南から北へ抜けていく車が高速で走行している。路面標示の「横断者注意」の白文字が剥離しているため、注意喚起としての効力が弱い。文字の再施工と路面の黄色着色をお願いしたい。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	舗装の修繕 横断歩道の前後に黄色の路面標示を入れる	R8年度以降施工
東近江警察署	既設の横断歩道標識の裏側にも追加し、視認性を上げる。	R8年度以降施工
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

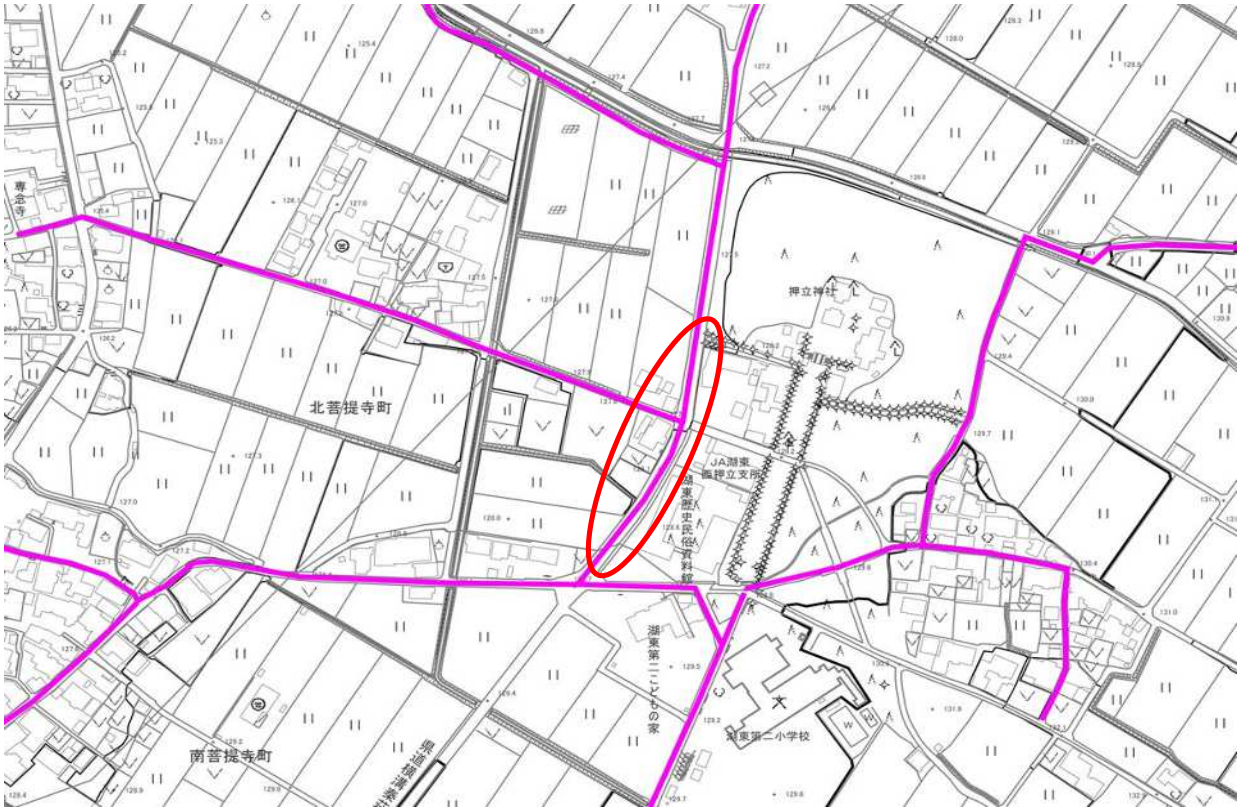

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日

通番	R0750	学校名	能登川東小学校	地区名	町名	小川町
No.	24			能登川地区		
路線名		県道福堂今線（192号）				
危険内容		学校近辺であり、多くの児童が信号待ちでたまるわりに特に安全対策がされていないため。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	歩道が狭いためガードレールは付けられない	対策困難
東近江警察署	該当なし	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	従道はそれほど交通量ないため、信号の後ろ側で待つように指導を。

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日

通番	R0751	学校名	能登川東小学校	地区名	町名	小川町
No.	25			能登川地区		
路線名		県道福堂今線（192号）				
危険内容		カーブ終わりで、信号もなく、スピードを出す車が多いため。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	横断歩道、東側センターラインの補修	R8年度以降施工
東近江警察署	精米機側横断歩道標識：もう少し目立つものに交換 反対側横断歩道標識：標識を組み替えて視認性を上げる	R8年度以降施工
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日

通番	市政要望等	学校名	教育委員会 能登川西小学校 ちどり幼児園	地区名	町名	伊庭町
No.	26			能登川地区		
路線名		県道柳川能登川線（194号） 小川・林・能登川線				
危険内容		【ちどり幼児園、能登川西小】 事故現場。安全対策がとれるか。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	路面標示の補修 舗装の修繕	R8年度以降施工
東近江警察署	止まれの標識を視認性の高いものに交換 信号機の設置はできない	R8年度以降施工
東近江市道路課	（交差点北側道路）外側線の引き直し （南側）舗装の補修	R8年度以降施工
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図


能登川西小学校
能登川西こどもの家
能登川西小学校
伊庭警察官駐在所
ちどり幼児園
能登川郵便局
県道柳川能登川線

東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日

通番	R0757	学校名	能登川南小学校	地区名	町名	長勝寺町
No.	27			能登川地区		
路 線 名		県道佐生今線（203号）				
危険内容		新しい道路ができたため、通学路が変更になり、安全に横断するために設置をお願いしたい。車通りも多く、横断歩道なしで道路を渡るのは危険である。 新しい道路ができ、以前からあった横断歩道が撤去されたが、長勝寺の子どもたちは、以前からの道路を通学路として利用している。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	該当なし	該当なし
東近江警察署	道路開発にあたって移設した南側の横断歩道を使用するよう勧奨。	該当なし
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日

通番	市政要望等	学校名	教育委員会 能登川南小学校	地区名	町名	佐生町
No.	28			能登川地区		

路線名	県道佐生今線（203号） 県道栗見八日市線（52号）
危険内容	【佐生自治会】 昨年開通した能登川北部線への進入口にあたり交通量が多くなっている。また、県道203号は将来的に交通量の増加が見込まれる。県道52号もJR隧道の改良に伴って交通量が増加している。

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	横断歩道の前後に黄色の路面標示を入れる	R8年度以降施工
東近江警察署	止まれの補修 停止線の補修 標識の補修	R8年度以降施工
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日

通番	市政要望等	学校名	教育委員会 湖東中学校	地区名	町名	小池町
No.	29			湖東地区		
路線名		主要地方道彦根八日市甲西線（13号）				
危険内容		湖東中学校への通学において、県道湖東彦根線（213号）の整備がされておらず危険なため、迂回路として主要地方道彦根八日市甲西線（13号）の交差点を横断するルートを通っている。 当該交差点は特に朝の時間帯は車両の往来も多く、カーブで見通しが悪いため危険である。				

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	交差点に黄色の路面標示を入れる	R8年度以降施工
東近江警察署	止まれの標識を新しいものに交換する	R8年度以降施工
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図



東近江市通学路点検詳細票

点検日	2026年2月26日

通番	R0701幼	学校名	そらの鳥こども園	地区名	町名	種町
No.	30			能登川地区		

路線名	県道佐生今線（203号） 神郷16号線

危険内容	横断歩道が敷設されておらず、散歩時に使用する際に危険である。

事業主体	対策内容	対策時期
東近江土木事務所	市道への外側線の一部を塗り直す。線の位置を内側にし、狭さくをかける。	R8年度以降施工
東近江警察署	横断歩道の新設検討	R8年度以降施工
東近江市道路課	該当なし	該当なし
東近江市教育委員会	該当なし	該当なし

対策前	対策後
 	

備考	

通学路点検箇所 位置図

